



No. progressivo (lasciare vuoto): _____

Richiesta di autorizzazione per eseguire degli scavi privati nell'area pubblica

Il presente formulario è da inoltrare almeno **15 giorni** prima della presunta data di inizio dei lavori:

- via e-mail all'indirizzo: **dui@locarno.ch**
- per posta all'indirizzo: **Città di Locarno, Servizi del territorio, Divisione Urbanistica e Infrastrutture Sezione genio civile, Via alla Morettina 9, 6600 Locarno**

Deve inoltre essere allegato l'estratto planimetrico con l'indicazione esatta dell'area di cantiere della relativa segnaletica e dell'ubicazione della stessa.

Proprietario/Istante: _____

Ditta esecutrice: _____

Località/via/piazza: _____

No. mappale del sedime comunale: _____ No. mappale del fondo privato beneficiante: _____

Descrizione delle opere - scopo dello scavo: _____

Inizio presunto dei lavori: _____ Fine presunta dei lavori: _____

Lunghezza scavo su marciapiede: ml _____ nella carreggiata: ml _____ larghezza scavo: ml _____

Resp. ditta: _____ Tel. ufficio: _____

Tel. privato: _____ e-mail: _____

D.L.: _____ Tel. ufficio: _____

Tel. privato: _____ e-mail: _____

Luogo e data: _____

Firma dell'istante: _____ Firma/Timbro dell'impresa: _____

L'autorizzazione alla manomissione del campo stradale è stata rilasciata da:

Data: _____ Firma e timbro: _____

Osservazioni: (lasciare in bianco)

Il rilascio della presente autorizzazione sottostà all'art.114 del Regolamento Comunale e all'Ordinanza municipale no. 015.2. È fissata una **Tassa di cancelleria**, pagabile a ricezione della relativa fattura, di:

CHF 60.-

Con la propria firma in calce, l'istante si dichiara fin d'ora debitore nei confronti del Municipio di Locarno dell'importo relativo al ripristino della pavimentazione dell'area manomessa che sarà eseguito tramite i Servizi del Territorio.

Lo stesso prende atto che tale importo sarà calcolato in base alla superficie effettiva rilevata a lavori ultimati ed ai prezzi d'offerta praticati dall'impresa aggiudicataria della manutenzione del Comune.

Parimenti dichiara pure di aver letto e accettato le condizioni generali riportate qui di seguito.

ATTENZIONE

I lavori non potranno essere iniziati prima di aver ottenuto la relativa autorizzazione da parte del Municipio di Locarno e della polizia Comunale di Locarno.

Condizioni generali inerenti i lavori di scavo


1. Il richiedente potrà iniziare i lavori soltanto dopo aver ottenuto tutte le necessarie autorizzazioni.
2. La decisione e la relativa documentazione devono rimanere a disposizione sul cantiere. La modifica dei programmi di realizzazione (data inizio e/o fine) può avvenire solo con il consenso delle parti interessate.
3. Il richiedente è tenuto ad informarsi presso gli enti preposti (per es. Swisscom, SES, AAP, UPC, privati, Comune, ecc.) circa la presenza di infrastrutture sotterranee. Se del caso, lo stesso dovrà eseguire manualmente i dovuti sondaggi. Eventuali danni cagionati sottostanno all'art. 41 del Codice delle Obbligazioni.
4. La responsabilità per qualsiasi danno o infortunio a terzi, causato dalle condizioni imperfette della strada durante e dopo i lavori di scavo, sarà a carico del responsabile/richiedente.
5. L'occupazione e la manomissione della strada dovrà essere limitata allo stretto necessario. Durante tutta la durata dei lavori deve sempre essere garantito il transito del traffico motorizzato. Qualsiasi sbarramento al traffico motorizzato deve essere preventivamente concordato ed autorizzato con la Polizia Comunale di Locarno. Inoltre il richiedente o l'esecutore dei lavori si impegnano ad avvisare i confinanti ai quali, causa lavori, venga impedito l'accesso veicolare al proprio fondo.
6. Gli accessi alle singole proprietà devono essere assicurati; per la circolazione dei pedoni dovranno essere attuate tutte le misure di sicurezza necessarie.
7. Per quel che riguarda l'esecuzione degli scavi nelle strade pubbliche fanno stato le norme SN 640 538a.
8. I lavori di scavo devono essere adeguatamente segnalati e protetti mediante la posa dei necessari cartelli e recinzioni.
9. Deve essere rispettata l'Ordinanza municipale concernente la repressione dei rumori molesti.
10. Il riempimento dello scavo dovrà essere eseguito costipando adeguatamente il materiale in modo da evitare cedimenti. Qualora non venga eseguito subito il ripristino della pavimentazione è indispensabile posare della miscela bituminosa a freddo o una cappa in calcestruzzo quale pavimentazione provvisoria. L'esecuzione è da concordare preventivamente con il Comune di Locarno. Il Comune si riserva il diritto di far sostituire, a spese del richiedente, il materiale di riempimento qualora questo non risultasse idoneo.
11. I manufatti (pozzetti, camere e simili) delle condotte sotterranee, cavi, etc. che vengono a trovarsi sul campo stradale, devono essere costruiti in considerazione dei carichi statici e dinamici gravanti sugli stessi. E' quindi richiesto, nel caso di tubi in cemento posati verticalmente, uno spessore minimo di rinforzo esterno alle pareti di 12 cm, da eseguire con calcestruzzo BN CP 200 kg/m³.
12. Le coperture per pozzi (ghisa stradale) che vengono a trovarsi sulle strade comunali, devono avere una resistenza minima al carico / ruota di 10 ton.
13. Per casi di eccezionale urgenza (rotture, ecc.), su richiesta dell'interessato, il Comune può concedere l'immediata esecuzione dei lavori, fermo restando l'obbligo dell'allestimento del relativo formulario di richiesta.
14. Il ripristino definitivo della pavimentazione, a spese del responsabile, sarà realizzato per il tramite dall'impresa aggiudicataria della manutenzione del Comune di Locarno. La superficie di ripristino della pavimentazione è in ogni caso da concordare con il Comune di Locarno.
15. L'autorizzazione può essere rifiutata in caso di manomissione di pavimentazioni definitive eseguite da meno di 5 anni.

Posa di infrastrutture longitudinali all'asse stradale

Di principio il ripristino della pavimentazione deve essere esteso sino a metà del campo stradale e più precisamente fra la delimitazione (pubblica o privata) del ciglio e l'asse stradale. Non sono accettati rappezzi con superfici troppo piccole che non garantiscono un'ottimale cilindratura della miscela o rappezzi che creano troppi giunti alla pavimentazione.

La larghezza minima del ripristino non potrà in ogni caso essere inferiore a 1.20 m.

La superficie di ripristino della pavimentazione è da concordare preventivamente con il Comune di Locarno.

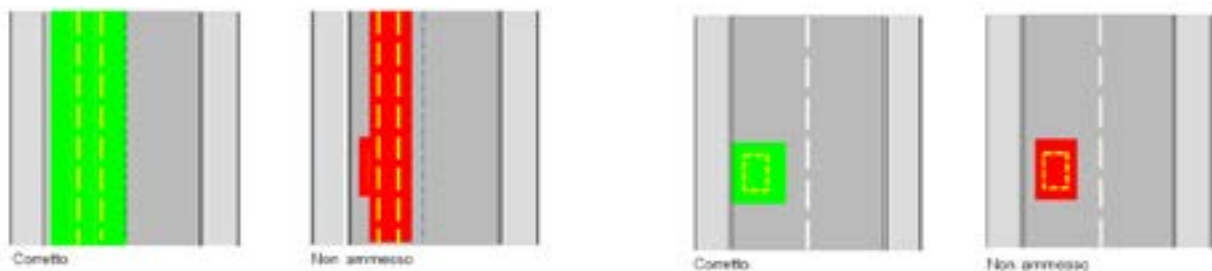


Posa di infrastrutture trasversali all'asse stradale

I tagli della pavimentazione devono essere effettuati il più possibile perpendicolari all'asse stradale. Qualora fosse necessario eseguire più tagli ravvicinati la pavimentazione deve essere estesa su tutto il campo stradale onde ottenere una superficie con un unico rappezzo.

La larghezza minima del ripristino non potrà in ogni caso essere inferiore a 1.20 m.

La superficie di ripristino della pavimentazione è da concordare preventivamente con il Comune di Locarno.



Marciapiedi

Di regola la pavimentazione deve essere ripristinata su tutta la larghezza del marciapiede.

La larghezza minima del ripristino non potrà in ogni caso essere inferiore a 1.20 m.

La superficie di ripristino della pavimentazione è da concordare preventivamente con il Comune di Locarno.

